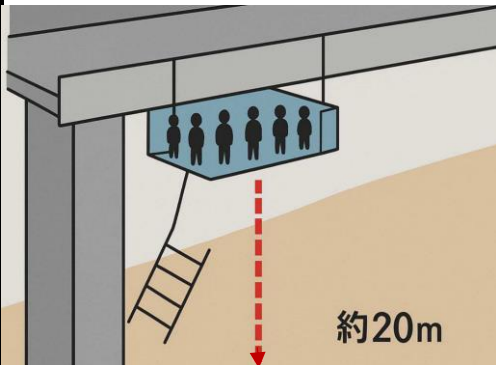


番号：R7-3

# 死亡災害等速報

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 発生月           | 令和7年1月                                                                                                                                                                                                                                   | 業種   | 建設業       |
| 起因物           | 足場                                                                                                                                                                                                                                       | 事故の型 | 2m以上からの墜落 |
| 災害発生状況※1      | <p>橋梁補修工事において、つり足場を組み立て中に、組み立てに使用する足場材を当該足場内に搬入していたところ、つり足場とともに作業員が約20m下の山中に落下したものの。</p>                                                              |      |           |
| 想定される再発防止対策※2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ つり足場の強度を確認し、つり足場上に搬入する足場材が許容荷重を超えないようにすること。また、1スパンごとの許容荷重、搬入する足場材の配置を作業員に周知し、つり足場上で偏荷重が生じないようにすること。</li> <li>○ つり足場組立時のアンカーの位置及び深さは計画とおりにすること。やむを得ず、変更する場合には、強度計算等を実施し、問題がないか確認すること。</li> </ul> |      |           |

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。
