

令和6年度災害復旧工事パトロールの実施結果




対象	件数	ランドマークの色
道路等改修	34	赤色
建物等改修・解体	89	青色
液状化箇所の道路等改修	7	黄緑色
液状化箇所の建物等改修・解体	19	オレンジ色

図1 災害復旧工事パトロールの現場の分類マップ
(R6.4～R7.3)

国土地理院地図を加工して作成

ランドマークの位置が重なったり、一部表示されていません

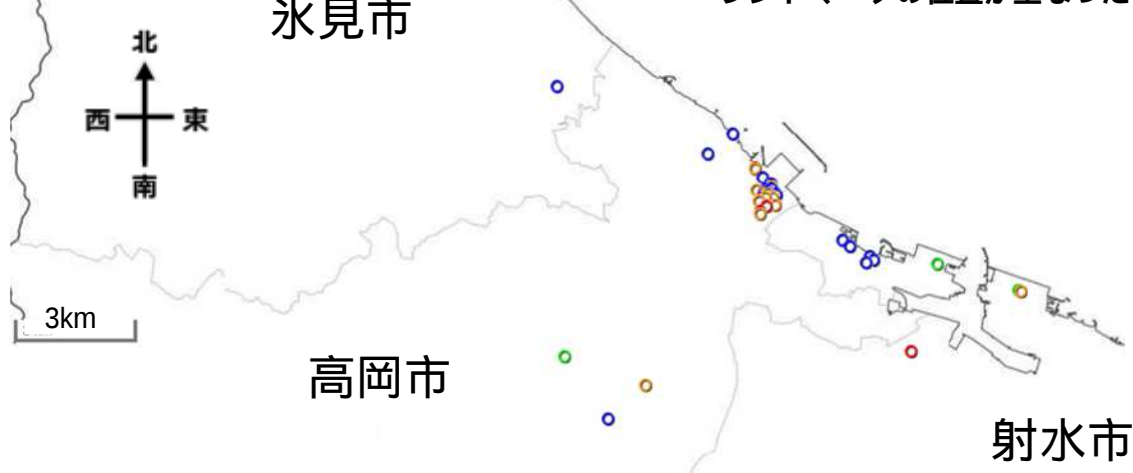

建物解体工事現場のパトロール時に、アスベストの有無を確認するため、写真のようにアスベストアナライザーを活用していました。

解体前に石綿事前調査を忘れずをお願いします！

アスベストアナライザー



復旧・復興ススメッ

技能講習修了証の不携帯が最も多かったです。皆さん、自動車に乗るときは免許を携帯する必要がありますよね。車両系建設機械も同じですよ！、メッ！



厚生労働省

富山労働局 高岡労働基準監督署

○ 災害復旧工事関連災害の概要（高岡労働基準監督署管内のみ）

発生月 業種 発注区分	事故の型 と起因物	発生状況
R6.2 土木工事業 地方公	金属加工 用機械に よる切れ	コンクリート内にある鉄筋をサンダーで切断していたところ、親指と人差し指の間を切ったもの。
R6.2 その他の建設業 民間	はしごか らの墜落	ライトの取り付けのため、脚立を用いて昇降したところ、バランスを崩し墜落したものの。
R6.3 土木工事業 地方公	その他の 建設機械 による はさまれ	道路舗装板の切断作業を行っていたところ、舗装板の下が空洞化していたため、陥没により舗装板が落下し、舗装板と機械の間に左足が挟まれたもの。
R6.4 建築工事業 民間	屋根から の墜落	住宅の屋根上で廃材の荷下ろしを行っていたところ、バランスを崩し、ダンプの荷台の上に墜落したものの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備を使用していなかったもの。
R6.4 建築工事業 民間	屋根から の墜落	住宅の屋根上で瓦工事を行っていたところ、屋根の端から、足を踏み外して、墜落したものの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備の未使用、保護帽を着用していなかったもの。
R6.5 建築工事業 民間	屋根から の墜落	蔵の屋根をはがすために、梯子を使って屋根に上がったところ、瓦の上で滑り、墜落したものの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備の未使用、保護帽を着用していたもの。
R6.8 建築工事業 民間	解体材の 飛来・落 下	住宅の2階で内壁の解体をしていたところ、解体廃材を落下させてしまい、階段下の労働者に落下したものの。
R7.2 土木工事業 地方公	掘削用機 械による はさまれ	車両系建設機械の走行範囲に労働者が立ち入り、キャタピラ部分に足を挟まれたもの。

○ 高岡労働基準監督署の取組みの概要

令和6年4月に富山県氷見市内において、瓦屋根葺き替え作業中、墜落して負傷する労働災害が発生しました。

本件同種労働災害を繰り返さないために関係団体に要請を行っています。要請の内容は、富山労働局のホームページに掲載していますので、災害復旧工事以外の工事においても参考にしてください。

要請等の掲載場所は、



富山労働局＞ニュース&トピックス＞労働基準監督署からのお知らせ＞高岡労働基準監督署からのお知らせ
